




現場だより



月号

令和2年度農業災害対策整備事業八ヶ川地区第2号工事

【工期】令和2年度11月4日～令和4年度3月18日

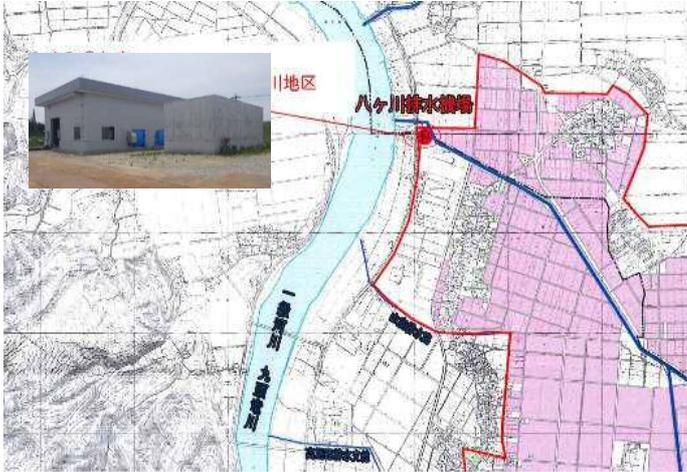

工事の概要

大雨による九頭竜川の増水で、支流である八ヶ川に水が逆流し、氾濫する恐れがあります。


これを防ぐため、八ヶ川排水機場にポンプを設置する工事を行っています。

このポンプにより、九頭竜川の水位が上昇した場合でも、八ヶ川から九頭竜川に水を流し、八ヶ川の氾濫を防ぎます。

工事の進捗状況



機械基礎
鉄筋・型枠組立

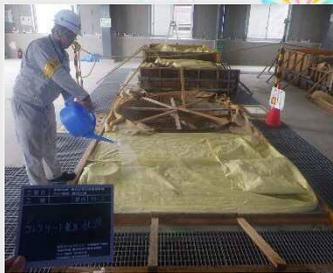

機械基礎
コンクリート打設・養生



機械基礎 完成



現場監督からひとこと



私共は日頃から安全第一を心掛け、毎日の現場巡回、毎月の社内安全パトロールを行っております。また、先月は外部専門機関の安全パトロールを実施し、普段とは違った視点でのアドバイスを頂きました。このようなことも行いながら、現場での安全意識や緊張感を高め、現場で働く人たちの命と健康を守っていききたいと思います。更に、このような活動が地域の皆様のより良い暮らしと安全を守ることに繋がるよう、安全第一、災害ゼロで工事を進めて参ります。



(株)サカイエステック×北陸設備工業(株)

令和2年度農村災害対策整備事業
八ヶ川地区第2号工事特定建設工事共同企業体

